




बलेफी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बलेफी, सिन्धुपाल्चोक

वार्षिक प्रगति समिक्षा
आर्थिक वर्ष : २०७९/०८०

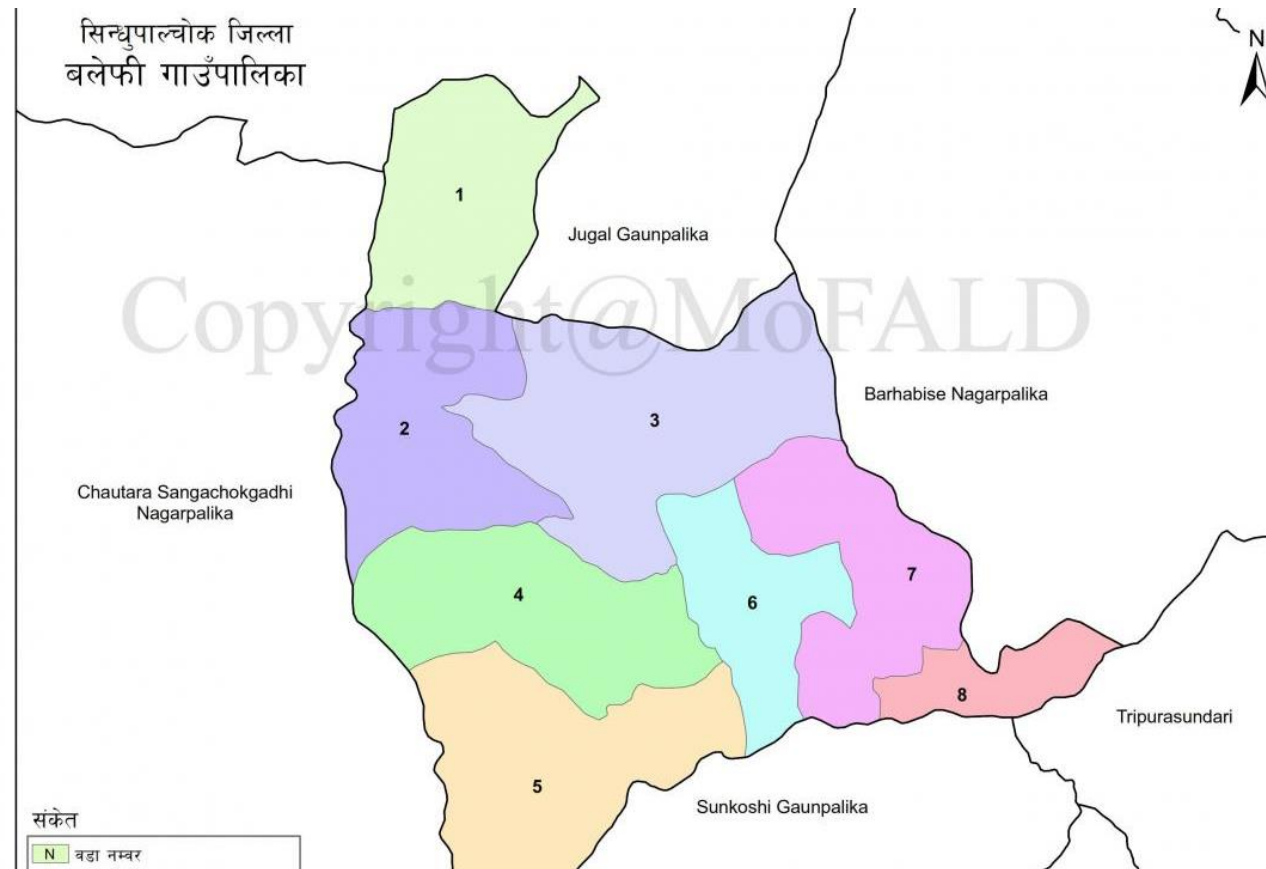

"कृषि योग्य व्यापारिक र पर्यटकीय ठाउँ, नविन सोच सहितको
समृद्ध बलेफी गाउँ"
बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक



योजना तथा पर्वाधार विकास शाखाको प्रगति विवरण २०७९/८०



योजना तथा पूर्वाधार विकास शाखाको प्रगति विवरण २०७९/८०

गाउँपालिका प्रशासकीय भवन :

- संख्या १, निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको
- वडा कार्यालयहरु: जम्मा ८ वटा, निर्माण सम्पन्न ३, निर्माण हुदै २, अस्थायी संरचना निर्माण भएको १, अन्य सरकारी निकायबाट संचालन २ वटा

स्वास्थ्य संरचना अवस्था :

- १५ शैयाको अस्पताल निर्माण हुदै वडा न १ जलविरे, वडा स्तरी स्वास्थ्य केन्द्र जम्मा ८ भवन निर्माण भएको

आ.व. २०७९/८० पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजनाको विवरण

- आ व २०७९।८० मा निर्माण कार्यसंग सम्बन्धीत योजना : ३८५
- उपभोक्ता समिति गठन तथा गाउँपालिकामा दर्ता भएको संख्या : २६३
- उपभोक्ता समितिबाट सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएका योजना संख्या : २४२ रु.६,३१,८३,६७८
- कोटेशन तथा अमानतबाट निर्माण भएका योजना संख्या : १७ रु ५८,९४,९६८
- ठेक्का प्रकृयाबाट निर्माण भएका योजना संख्या : ११ वटा एक वर्षिय, ४ वटा बहुवर्षिय गरी जम्मा १५ रु.७,६०,३२,६६०
- भुक्तानीको लागि सिफारिस भइ भुक्तानी हुन बाँकी : ३३ वटा रु.८७,६३,७३६
- सम्झौता भइ निर्माण कार्य नभएका योजनाको विवरण : १३ रु.१७,५०,०००
- सम्झौता हुन बाँकी देखिएका योजनाको विवरण : ६० रु. १,१०,७१०००



गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयका प्रशासकीय भवनको अवस्था

गाउँपालिका प्रशासकीय भवन

स्थानीय पूर्वाधार विभाग साझेदारी ६०% र बलेफी गाउँपालिका ४०% लागत साझेदारीमा निर्माण

कुल लागत रु.
१०,८९,०४,२०६

ठेक्का लागत रु. ५,९६,७७,५७३.८

हाल सम्मको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति

आ.व.२०७७-७८ देखि २०७९-२०८० सम्म	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति
	बजेट	खर्च	
	५,९६,७७,५७३.८	४,९६,७५,३३९	९२%
आ.व.२०७९-२०८०		१,१९,१९,२३८.५७	

वडा कार्यालय भवनहरूको अवस्था

जम्मा वडा कार्यालय संख्या	स्थायी संरचना निर्माण सम्पन्न	स्थायी संरचना निर्माण हुदै	अस्थायी संरचना निर्माण	भाडा तथा अन्य सरकारी भवनमा कार्यालय रहेको अवस्था
८	३	२	१	२





गाउँपालिका स्वास्थ्य संरचनाको अवस्था

गाउँपालिका तथा वडा स्वास्थ्यका भवन निर्माणको				
१५ शैया भवन निर्माण जलविरे				
संघिय सरकार एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटबाट				
कुल लागत रु.१८,००,००,०००		ठेक्का लागत रु.११,७८,१६,२१४		
हाल सम्मको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति				
आ.व.२०७७-७८ देखि २०७९-२०८० सम्म	वित्तिय प्रगति		भौतिक प्रगति	
	बजेट	खर्च		
	११,७८,१६,२१४	५,४५,५८,७७४	५२ %	
आ.व. २०७९-२०८०		३,६७,५८,४७९		
वडा कार्यालय भवनहरुको अवस्था				
वडा स्वास्थ्य सेवा भवन संख्या जम्मा	स्थायी संरचना निर्माण सम्पन्न	स्थायी संरचना थप तला निर्माण	अस्थायी संरचना निर्माण	भाडा तथा अन्य सरकारी भवनमा कार्यालय रहेको अवस्था
८	७	१	०	०





प्रदेश सशर्त अनुदान पूँजीगत

	प्रदेश सशर्त अनुदान			
सि. नं.	योजनाको नाम	वडा	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु
१	टोप्का भिर रेलिङ निर्माण	८	२५,००,०००	२४,२५,०००
२	नौविसे फाँट सिंचाई	२	२५,००,०००	२४,२५,०००
३	च्यानडाँडा खानेपानी	३	२५,००,०००	२४,२५,०००
४	अंधेरी मांखा बुवाँसे ओमपार्क सडक	६	२५,००,०००	२४,२५,०००
५	काठे विज्जेल सडक	५	२५,००,०००	२३,९७,५२२.७२
६	बाँसबोटे आदमार पधेरेचौर सडक	५	२५,००,०००	२३,९६,९४९.२७
	जम्मा	६ वटा	१,५०,००,०००	१,४४,९४,४६४





जि.स.स.को लागत साझेदारीमा सञ्चालित योजना

सि. न.	योजनाको विवरण	वडा न	जि.स.स. अनुदान	पालिका समपुरक	जम्मा बजेट रकम रु	बजेट खर्च रु
गत वर्ष सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएका योजनाहरू						
१	बलेफी मा.वि. भवन निर्माण	५	३०,००,०००	२०,००,०००	५०,००,०००	४८,५०,०००
२	वडा न ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण	३	४५,००,०००	३०,००,०००	७५,००,०००	२२७७४४७
	जम्मा		७५,००,०००	५०,००,०००	१,२५०,०००	७१,२७,४४७



उपलब्धी :

- वडा कार्यालय भवन : वडा नं ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुन वाँकी ।
- विद्यालय भवन निर्माण : वडा नं ५ को बलेफी मा.वि. ४ कोठे विद्यालय RCC भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइ अन्तिम भुक्तानी
- १०० % भौतिक तथा ७५ % वित्तिय प्रगति भएको छ ।



सङ्घीय समपुरक अनुदान पूँजीगत तर्फ

सि. नं.	कार्यक्रम को नाम	संघिय अनुदान	गाउँपालिका समपुरक रकम	जम्मा बजेट	ठेक्का रकम	बजेट खर्च
१	जलविरे बनकाली हगाम सडक स्तरोन्नती	१,१०,००,०००	१,१०,००,०००	२,२०,००,०००	१,२९,५६,०८७	१,२९,७२,८७६
सङ्घीय विशेष अनुदान						
१	कपिलेश्वर वृद्धाश्रम भवन निर्माण	१,३०,००,०००	०	१,३०,००,०००	१,०८,६४,५१९	१,२१,५८,५८४
२	सिमासिङ खानेपानी	१,३०,००,०००	०	१,३०,००,०००	८७,५०,००५	८७,११,५८८
	जम्मा	२,६०,००,०००	०	२,६०,००,०००	१,९६,१४,५२५	२,०८,७०,१७२





समपुरक तथा विशेष अनुदान पूँजीगत प्रदेश

सि. नं.	प्रदेश वजेट	प्रदेश अनुदान	गाउँपालिका समपुरक रकम	जम्मा बजेट	ठेक्का रकम	वजेट खर्च
प्रदेश समपुरक अनुदान						
१	सातदोबाटो कोले सडक स्तरोन्नती	९९,९९,०००	९९,९९,०००	१,९९,८२,०००	९८,४४,९६७.४२	९३,८२,४७८.९९
२	कोले डाँडागाउँ सडक स्तरोन्नती	९९,७२,०००	९९,७२,०००	१,९९,४४,०००	९९,३७,६५६.७३	१,०९,२०,६३२.९९
३	डाँडागाउँ चिलाउने सडक स्तरोन्नती	९९,७३,०००	९९,७३,०००	१,९९,४६,०००	१,१२,३३,४९२.६७	१,०९,५५,०९२.९६
	जम्मा	२,९९,३६,०००	२,९९,३६,०००	५,९८,७२,०००	३,१०,१५,३९६.८२	३,०४,५८,२०३.२
प्रदेश विशेष अनुदान						
१	खाडीचौर अधुरो खानेपानी निर्माण	३५,००,०००	०	३५,००,०००	३४,२६,०४३.४२	३३,४३,५९७.३४





सडक बोड नेपाल सडक मर्मत कार्यक्रम

सि.नं	योजनाको विवरण	सं ख्या	बजेट रकम रु	बजेट खर्च रकम रु
१	कोठे विन्जेल सडक मर्मत	१	६,००,०००	५,८२,०००
२	खडिचौर तिनकुने पहरीगाउँ सडक मर्मत	१	१९,००,०००	१९,००,०००
	जम्मा		२५,००,०००	२४,८२,०००



गाउँ पालिका तर्फका
योजना तथा आयोजनाहरु
प्रगति विवरण



१.२.१ यातयात पूर्वाधार विकास

सि नं	विवरण	संख्या	बजेट	खर्च
१	सडक सरसफाई तथा मर्मत कार्यक्रम	६	२८,९३,९६८	२७,९२,२०५
२	तीन लाख भन्दा कम वस्ती स्तरीय सडक निर्माण तथा मर्मत	४०	७४,२७,०००	७२,०१,५६८
३	तीन लाख भन्दा माथि पाँच लाख भन्दा तलका सडक निर्माण तथा मर्मत	८	३३,५०,०००	३२,४९,५००
४	पाँच लाख भन्दा माथि ठूला पालिका स्तरीय सडक निर्माण तथा मर्मत	२	१५,००,०००	१४,५५,०००
५	गोरेटो बाटो निर्माण योजना	३२	४५,४५,०००	४३,८८,४०६
	जम्मा	८८	१,९७,१५,९६८	१,९०,८६,६७९





२. खानेपानी तथा सरसफाई

२. खानेपानी तथा सरसफाई				
सि. नं.	विवरण	संख्या	बजेट रु	खर्च रु
१	खानेपानी योजना निर्माण	१२	१४,५०,०००	१३,७३,५००
२	खानेपानी योजना मर्मत	१८	२४,८१,०००	२३,९९,८६४
३	मागमा आधारित खानेपानी पाइप वितरण	०	०	०
	जम्मा	३०	३९,३१,०००	३७,७३,३६४





२.३ सिञ्चाई तर्फका पूर्वाधार विकास योजना

२.३ सिञ्चाई तर्फका पूर्वाधार विकास योजना

सि. नं.	विवरण	संख्या	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु
१	सिचाई कुलो पाईप सिंचाई जस्ता साना सिंचाई योजनाहरु निर्माण	२१	४३,००,०००	४१,७९,७६७
२	सिचाई कुलो पाईप सिंचाई जस्ता साना सिंचाई योजनाहरु मर्मत	९	१२,५०,०००	१२,१२,५००
३	सिंचाई पोखरी	२	४,५०,०००	४,३६,५००
	जम्मा	३२	६०,००,०००	५८,२८,७६७





२.४ भवन आवास तथा सहरी विकास

सि. नं.	विवरण	संख्या	बजेट रकम रु	बजेट खर्च रकम रु
१	सरकारी भवन	२	१८,००,०००	१७,४६,०००
२	सामुदायिक भवन	४	७,००,०००	६,७९,०००
३	सहकारी भवन	३	६,००,०००	५,८२,०००
४	क्रियापुत्री भवन	१०	१८,५०,०००	१७,९४,०००
५	धार्मिक तथा अन्य भवन	२	२,००,०००	१,९४,०००
	जम्मा	२१	५१,५०,०००	४९,९५,०००





२.५ मठ मन्दिर गुम्वा चर्च घाट निर्माण

सि नं	विवरण	संख्या	बजेट	खर्च
१	मठ मन्दिर	२६	५७,२०,०००	५५,४८,४८५
२	गुम्वा	३	१०,००,०००	९,७०,९५२
३	चर्च तथा मण्डली	५	३,३०,०००	३,२१,३००
४	घाट निर्माण	१०	२४,००,०००	२३,२८,०००
	जम्मा	४४	९४,५०,०००	९१,६८,७३७





२.६ उर्जा विकास, झो.पु. विपद् बाढी तथा पहिरो प्रतिक्षालय तथा पार्क खेलकुद तथा विविध

सि नं	विवरण	संख्या	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु
१	उर्जा विकास	१	३६,००,०००	३५,२४,९७६
२	पुल तथा झो पु	२	२०,००,०००	२०,००,०००
३	पहिरो तथा नदि नियन्त्रण	१२	१५,७५,०००	१५,३६,५५०
४	प्रतिक्षालय तथा पार्क निर्माण	१०	११३००००	१०,९६,१००
५	खेल मैदान	५	८,५०,०००	८,२४,५००
६	अन्य विविध योजना	५	८,५०,०००	८,४१,०००
	जम्मा	३५	१,००,०५,०००	९८,२३,१२६





उपलब्धि

क्र.स.	विवरण	परिमाण	इकाइ
१	सडक ढलान	७५०	मिटर
२	सडक ग्रावेल तथा नाला निर्माण	४.५	कि.मि.
३	नयाँ सडक ट्याक निर्माण	१२००	मिटर
४	सडक सोलिड	३२००	मिटर
५	ग्विन वाल निर्माण	६००	घ. मी.
६	प्लम वाल निर्माण	२५	घ. मी.
७	स्टोन मेशिनरी वाल निर्माण	३०००	घ. मी.
८	सिंढी तथा गोरटोबाटो निर्माण	५२००	मिटर
९	खानेपानी निर्माण तथा मर्मत	३०	वटा
१०	साना सिंचाइ	३२	वटा
११	भवन आवास तथा सहरी विकास	२१	वटा
१२	मठ मन्दिर गुम्बा चर्च	३५	वटा
१३	उर्जा,झो.पु.,विपद, पार्क तथा प्रतिक्षालय खेलकुद, विविध उर्जा विविध	३५	वटा





सबल पक्षहरु

- गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्रबाट सबै वडाहरुमा सडक सञ्जाल पुगेको ।
- गाउँकर्यपालिका र सभाका निर्णयहरु स्वतः स्फूर्त रुपमा पालिकाको वेभसाइटमा राख्ने गरेको ।
- गाउँपालिका सम्पदित कार्यक्रम तथा पूर्वाधार योजनाहरूसंग सम्बन्धीत रहेर सार्वजनिक सुनुवाइ, स्थानीय समुदायबाट आएका जिज्ञासा तथा गुनासाहरुको सम्बोधन भएको ।
- स्थानीय स्तरमा गठन भएका उपभोक्ता समितिलाइ गाउँपालिका दर्ता गरी सम्झौता र प्यानका आधारमा भुक्तानी गरिएको ।
- निर्माण सम्पन्न भएको योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन पश्चात मात्र भुक्तानी भएको
- प्रत्येक योजनाको सार्वजनिक परीक्षण विना कुनै पनि कार्यक्रमको भुक्तानी नगर्ने गरेको ।



कमी कमजोरीहरु

- गाउँपालिका स्थायी प्रशासनीक भवन नहुदा प्रशासनीक कार्य भाडा लिएका भवनबाट कार्यालय काम काग गर्न साँघुरो तथा कार्यालय भवन छरिएर रहेको हुदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको ।
- दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार पालिका निर्माण भएका गुरु योजना, आवाधिक योजना, साथै वार्षिक योजना निर्माणमा तादम्यता तथा वास्तविक समस्या जान नसकेको ।
- माग भएका योजना धेरै र स्रोत साधन कमी हुदा बजेट विनियोजन हुँदा धेरै हुदा एउटै योजना सम्पन्न गर्न धेरै बर्ष लाग्ने गरेको ।
- कर्मचारीको क्षमता विकासमा पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसकेको ।
- ८ वटा वडा कार्यालय मध्ये ३ वडाहरुको मात्र स्थायी वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको ।
- उपभोक्ता समिति गठन र समिति तथा पदाधिकारी छनौटमा खुल्ला तथा सर्व सहमतिमा गठन हुन नसक्दा निर्माण कार्यको विल भरपाइ तयारी, सम्पन्नताको कागजपत्र लेखन र कागजपत्र तयारी गर्न तथा आवश्यक कागजपत्र पुर्याउन नसक्नु र भुक्तानीको लागि धेरै चोटी धाउन परेको ।
- केही योजनाहरुमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुमा एकै व्यक्ति दोहोरि रहनु ।
- सम्झौता गर्दा तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्नु साथै सम्पन्न भएका योजनाहरुमा पनि विविध कारणले समयमा नै भुक्तानी गर्न नसक्नु ।



अवसरहरु

- ब्रह्मायणी र सुनकोशी नदीको बीचमा रहेको बलेफी गाउँपालिका भए पनि यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन समुचित परिचालन गर्न अवसर रहेको ।
- सुनकोशी र ब्रह्मायणी Rafting तथा Boating बाट आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न ।
- ब्रह्मायणी र सुनकोशी नदीबाट आउने ढुंगा, गिटी, बालुवा, काठ जस्ता बगरे जाने नदिजन्य बस्तुको सदुपयोग गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न ।
- सडक संजाल सबै वडा र वस्तीसंग विस्तार भएसँगै स्थानिय उत्पादन, उत्पादन लाई निर्यात र विक्रीबाट आर्थिक वृद्धि गर्न ।
- कृषि र पशुपालनलाई वातावरण भुगोल अनुसार पकेट क्षेत्रको रूपमा व्यावसायिक रूपमा विकास गरी उत्पादन र रोजगार वृद्धि गर्न ।
- पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि स्थानीय मैलिक साँस्कृति, स्थानीय पर्व, धार्मिक स्थल, जस्ता पर्या प्रयावरणीय क्षेत्रको विकास गरी पर्यटकिय सेवाबाट आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न ।



चुनौती :

- दीगो रूपमा आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि गर्न ।
- विकास, वातावरण र विपद बीच सन्तुलन कायम गर्न ।
- प्राकृतिक स्रोतको बाँढफाँट र विकास व्यवस्थापन गर्न ।
- निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाहरूको अपनत्व र मर्मत संम्हारको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्ताले लिन ।
- लागत रलाभ सहित वित्तीय विश्लेषण सहितको योजना निर्माण गर्न ।

धन्यवाद
